Print Form

AUKTORISERAT FÖNSTERUNDERHÅLL

CHECKLISTA 1

Beställningsunderlag/Åtgärdsprogram
Egenkontroll enligt ISO 9001

Rita fönster nr 40-

© 2015 Auktoriserat Fönsterunderhåll, Växjö

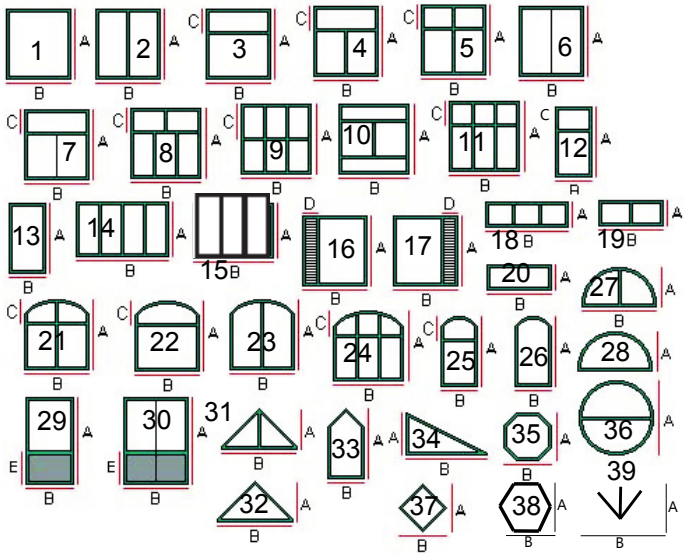

Ort och datum

Objekt Nr

Adress

Beställare Tel

Kontaktperson Tel

Auktoriserat Företag Tel

Kontaktperson Tel

I Val av fönster/-dörrtyp

II Spröjs i båge/övre båge ritas ut

III Val av bågtyp

☐ Inåtgående ☐ Utåtgående ☐ Pivå ☐ Fasta

IV Färgsystem

V Val av åtgärd

☐ Fönsterskydd

☐ De-, montering /Justering

☐ Fuktkontroll %

Fönster dörr/typ Nr 1-40	Antal	Karm-höjd A	Karm-bredd B	Karm-höjd C	Karm-bredd D	Dörr-spegel höjd E

Karm

Best. UTSIDA
Färgborttagning 3
☐ 100% ☐ 50% ☐ 25%
☐ Färgrengöring 4 (5)
☐ Fönsterbleck 6
☐ **Trälagning 19** se Tillval
☐ **Beslag 14** se Tillval
☐ **Tätlist 15** se Tillval
☐ **Tilluftsdon 17** se Tillval
☐ Olja och Grund11
☐ 2-3 ggr Målning 12
☐ **Övrigt** se Tillval

INSIDA
Färgborttagning 3
☐ 100% ☐ 50% ☐ 25%
☐ Färgrengöring 2B (2C)
☐ **Beslag 14** se Tillval
☐ Olja och Grund 11
☐ 2 ggr Målning 12

KITTYP
☐ LA Seal
☐ Linoljekitt
☐ _____

Utfört Sign.

Ytterbåge/-dörr

Best. UTSIDA
Färgborttagning 3
☐ 100% ☐ 50% ☐ 25%
☐ Färgrengöring 4 (5)
☐ Färgbortt. profil. trä
Kittborttagning 7
☐ 100% ☐ 50% ☐ 0%
☐ Kittning 100% 8
☐ Kittkomplettering 50% 9
☐ **Glasningsskena/Toppförs 20**
☐ Glasbyte18seTillval
☐ **Trälagning 19** se Tillval
☐ **Beslag 14** se Tillval
☐ Olja och Grund 11
☐ 2-3 ggr Målning 12
☐ **Övrigt** se Tillval

INSIDA
Färgborttagning 3
☐ 100% ☐ 50% ☐ 25%
☐ Färgrengöring 4 (5)
☐ Kantförsegling 10
☐ **Beslag 14** se Tillval
☐ Olja och Grund 11
☐ 1-2 ggr Målning 12

Utfört Sign.

Innerbåge/-dörr

Mellanbåge/-dörr ☐ Lika med innerbåge

Best. UTSIDA
Färgborttagning 3
☐ 100% ☐ 50% ☐ 25%
☐ Färgrengöring 4 (5)
Kittborttagning 7
☐ 100% ☐ 50% ☐ 0%
☐ Kittning 100% 8
☐ Kittkomplettering 50% 9
☐ **Glasbyte 18** se Tillval
☐ **Trälagning 19** se Tillval
☐ **Beslag 14** se Tillval
☐ **Tätlist 15** se Tillval
☐ **Tilluftsdon 17** se Tillval
☐ Olja och Grund 11
☐ 1-2 ggr Målning 12
☐ **Övrigt** se Tillval

INSIDA
Färgborttagning 3
☐ 100% ☐ 50% ☐ 25%
☐ Färgrengöring 4 (5)
☐ Kantförsegling 10
☐ **Beslag 14** se Tillval
☐ Olja och Grund 11
☐ 2 ggr Målning 12

Utfört Sign.

AUKTORISERAT FÖNSTERUNDERHÅLL

2015 Auktoriserat Fönsterunderhåll, Växjö

Checklista 2

Tillval + ÄTA-arbeten

enligt ISO 9001

Auktoriserat Företag

Objekt	Adress	Datum

Fönstrets nr enligt ritning/planskiss	Tillval	Ingår i offert	Utfört Signatur
	ÄTA - Ändrings-, Tilläggs- och Avgående arbeten	**Ingår ej i offert**	

Fönstermålning

Inåtgående

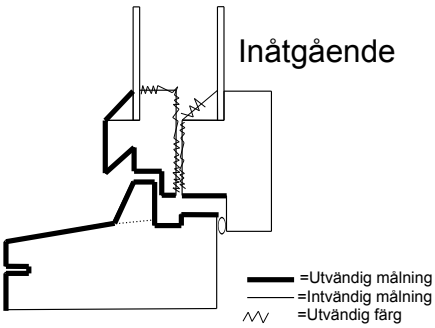

Utåtgående

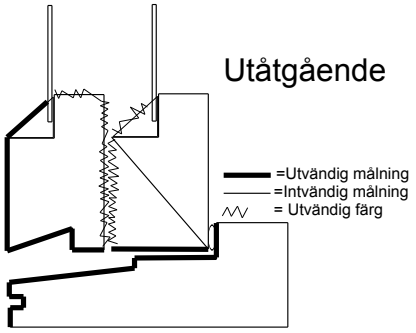

Trä
Trälagning (19) pris/tim
Byte - Bågbottenstycke, á-pris
Byte - Karmbottenstycke, á-pris
Byte - Båg-/Karm-sidostycke, á-pris
Persienner
Fönsterputs

Tätlister pris/lpm
Tätlister (15) typ
Dammlister (16) typ

Glasbyte (18) pris/kvm
Standardglas 3mm
Kulturglas
Energiglas 4/6mm

Tilluftsdon/ventiler/diffusor (17)
Biobe
Omega

Beslag (14) pris/st
Nya hörnbeslag/.järn
Återbrukade hörnbelag/-järn
Stormhaspar
Fönsterlås
Fönstervred
Koppelskruvar 30-65mm
Koppelhake m. skurv
Spanjoletthandtag
Vädringsbeslag
Glidbleck
